

О проделанной работе ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур за август 2026 г.

В августе 2026 года ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур обеспечивало устойчивое и бесперебойное функционирование объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры города и космодрома «Байконур». Основная деятельность предприятия в отчетный период была направлена на стабильное обеспечение потребителей тепловой и электрической энергией, услугами водоснабжения и водоотведения, а также на выполнение комплекса мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.



Теплоэлектростанция

Теплоэлектростанцией в течение августа обеспечена стабильная выработка тепловой энергии для нужд потребителей – 6 655,211 Гкал.

Выполнено техническое обслуживание (ТО):

- насосного парка КТЦ, ЦПСВ ТЭС -5 ед. (ПЭН ст. №5, СтАгр № 1,4,5; НПТС №6);
- главного паропровода 3,4 очереди КТЦ; паропровода 1,2 ата 4 очереди КТЦ;
- пиковых и основных бойлеров -5 ед. (БП-2,3; БО-5а,6а,7);
- котлоагрегата КА ст. № 4, 5, 7 и вспомогательных оборудования – 7 ед. (сепараторов СНП ст.№ 4,7; дымососа ст.№4,7; дутьевых вентиляторов №4,7; паровой турбины №6);

Выполнен текущий ремонт водогрейного котла ПТВМ-50-2 ст. №3;

Продолжаются:

- ремонт электрооборудований ТЭС (масляные выключатели отходящих линий яч. №11-1Р, яч. №90 ГРУ-6 кВ, п.21У ГЩУ; яч. №92 ГРУ-6 кВ, п. 22 ГЩУ; яч. №22-2Р п. 22У ГЩУ; яч. №262Р; яч. №141 ГРУ-6кВ; электрооборудование ТДН-2; КРУСН-6 кВ; яч. №102,104,106 ГРУ -6 кВ, п. 14У, 123 ГЩУ);

Все эксплуатационные дефекты устранялись в регламентные сроки.



Цех высоковольтных электрических сетей.

Специалисты подразделений провели плановое техническое обслуживание подстанций и закрытых распределительных устройств, а также работы, не предусмотренные годовым планом.

Проведено техническое обслуживание компрессорных установок КУ ВШВ-2,3/230 №1,2,3 на компрессорной станции КС главной понижающей подстанции ГПП-2. Вне плана выполнено техническое обслуживание электрооборудований на ОРУ-35 кВ и на ОРУ-110 кВ (масляных выключателей, линейных разъединителей, реакторов, трансформаторов напряжения, трансформаторов тока), всего – 21 ед.

Произведен обход и осмотр воздушных и кабельных линий электропередачи различных классов напряжения включая линий электропередачи напряжением 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ – 58 ед. (ВЛ, КЛ).

Цех городских электрических сетей

Силами ЦГЭС выполнено техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанции ТП-6/0,4кВ – 8 ед. Выполнены техническое обслуживание и профконтроль устройств релейной защиты масляных

выключателей и приводов – 38 ед.(НС-3А, НС-2А, ЦРП-3, КТПН-46). Произведено профвосстановление устройств РЗА – 33 ед. (НС-3А, НС-2А, ЦРП-3,). Восстановление и ремонт КЛЭП-6 кВ – 11 линии. Восстановление и ремонт КЛЭП-0,4 кВ – 0 линии. Кроме того, проведены высоковольтные испытания оборудования и профилактические измерения. Оперативно отрабатывались заявки потребителей на электромонтажные и восстановительные работы.



Цех тепловых сетей

В августе силами Цеха тепловых сетей осуществлялся постоянный контроль технического состояния магистральных и распределительных трубопроводов общей протяженностью 161727,4 пм. Также проводились работы по ремонту и замене отдельных участков трубопроводов различного диаметра:

- замена трубопроводов Ø 57 мм ; Ø 89 мм ; Ø 108 мм; Ø 159 мм ; Ø 219 мм; Ø 325 мм; Ø 377 мм – 489 м;
- замена отводы Ø108мм – 56шт; Ø89 мм – 7 шт; Ø377 мм – 1 шт;

ул. Сейфуллина, 4А:

- очистка обеспыливание трубопроводов Ø159 мм – 40 м ;
- гидроизоляция трубопроводов тепловых сетей Ø 159 мм – 190 м;
- демонтаж теплоизоляция Ø159 мм – 90 м.

ул. Ниточкина, 3Б. Детский сад №63 текущий ремонт:

- установка опор h= 3 м-3 шт.;

ул. Пионерская, УВД РФ:

- разработка грунта подземного перехода- 2,3м3;
- гидроизоляция трубопровода Ø 89 мм – 24 м;

- монтаж тр. Ø 89 мм – 20 м;
- замена отвода Ø 89 мм – 4 шт.;
- установка прямки из Ø 530 мм – 2 шт.;
- установка ЗРА Ду-80 мм-6 шт.;
- покраска ЗРА Ду – 500 мм-8 шт.; Ду- 50 мм-6 шт.;
- замена ЗРА Ду 250 мм- 1шт.; Ду 150 мм-2 шт.; Ду 100 мм- 4шт.; Ду 50 мм-2 шт.;
- ревизия ЗРА Ду 600 мм-2 шт.; Ду 500 мм-6 шт.; Ду 400 мм—2 шт.; Ду 300 мм- 18 шт.; Ду 250 мм- 3 шт.; Ду 200 мм- 26 шт.; Ду 125 мм- 5 шт.; Ду 150 мм- 26 шт.; Ду 100 мм- 57 шт.; Ду 80 мм – 50 шт.; Ду 50 мм- 30 шт.;
- гидроизоляция трубопроводов тепловых сетей Ø 57 мм – 48 м;
- монтаж металлического покрытия тепловых сетей Ø 219 мм – 12 м;

Работа на Базе:

- ревизия ЗРА Ду 200мм - 1шт, Ду 150мм – 2 шт.;
- изготовление хомут Ø 108мм – 5 шт.;
- изготовление отвод Ø108 мм – 11 шт, Ø89 мм – 23 шт, Ø 57 мм – 4 шт.

Оперативно устранялись выявленные дефекты. Особое внимание уделялось обеспечению качества ремонтных работ, соблюдению технологической дисциплины и рациональному использованию материальных ресурсов.



Эксплуатация и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения


Комплекс работ по обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения включал как плановые предупредительные, так и неотложные аварийно-восстановительные мероприятия. Осуществлялась профилактическая очистка канализационных сетей и колодцев в количестве –1500 пм. КК-89 шт. Ремонт

водопроводных и канализационных колодцев – 10 шт. замена участка трубопроводов сети холодного водоснабжения Ø 76 мм протяженностью – 10 пм по адресу: 6 А мкр., дом, д. 70, Ø 200 мм протяженностью – 12 пм по адресу: 6 А мкр., дом, д. 25. Ремонт участка трубопроводов сетей технического водоснабжения в количестве- 40 пм. В постоянном режиме осуществлялся лабораторный контроль качества питьевой, поверхностной и сточной воды. Все выявленные повреждения на городских сетях и объектах космодрома устранялись в оперативном порядке без прекращения водоснабжения потребителей.



Служба «Энергосбыт»

Служба «Энергосбыт» в плановом режиме обеспечивала расчеты за потребленные коммунальные услуги, контролировала объемы потребления энергоресурсов населением, рассматривала обращения граждан, а также проводила комплексную работу по урегулированию дебиторской задолженности. Документы (судебные приказы, исполнительные листы) направлены в ОСП по комплексу «Байконур» ГУФССП по МО, МОП Федерального казначейства, Кредитные учреждения (Банки), Клиентскую службу в г. Байконур ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан, Частному судебному исполнителю РК и по месту работы должников: **973 шт.**

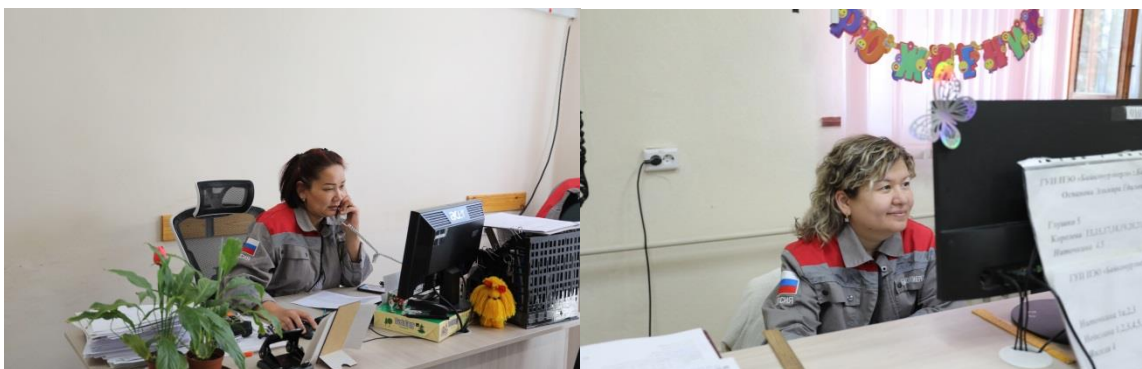

Благодаря своевременному и качественному выполнению намеченных мероприятий ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур обеспечило бесперебойное функционирование объектов инженерной инфраструктуры города, повысило надежность работы основного оборудования и сохранило необходимый уровень качества предоставляемых коммунальных услуг.
